


Comune di Ruoti

Provincia di Potenza

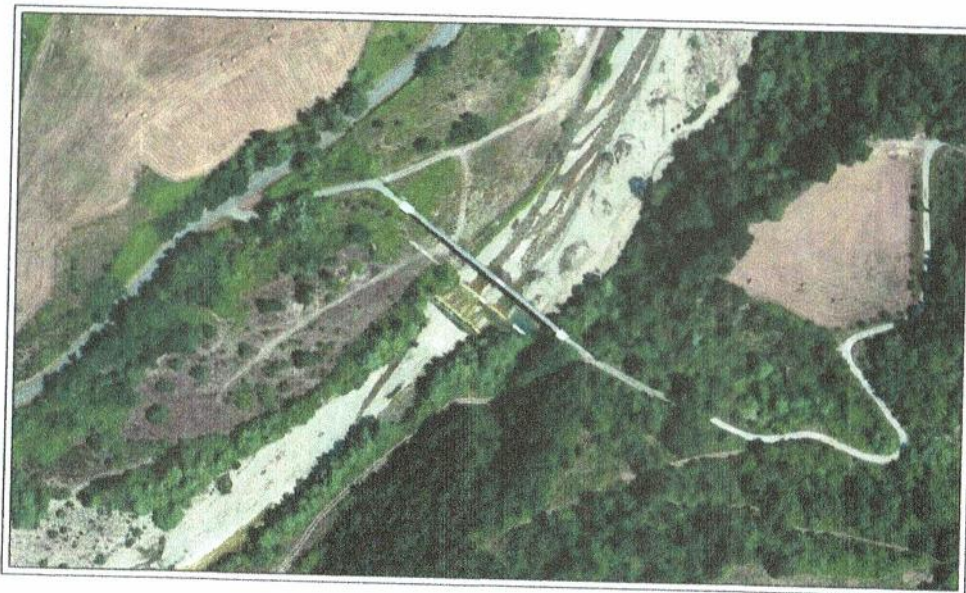

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori per il ripristino della Passerella " AVRIOLA"

Progettista: Prof. Ing. Armando Albi-Marini



Collaboratore: ing. Michelangelo Venditto

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO N°

15

REDAZIONE Luglio 2019

IL SINDACO :
Dott. Anna Scalise

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
ing. Rosario Famularo

Comune di RUOTI
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PASSERELLA AVRIOLA

COMMITTENTE: COMUNE DI RUOTI.

CANTIERE: C.DA AVRIOLA , RUOTI (PZ)

Napoli, 06/07/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(PROF. ING. ALBI-MARINI ARMANDO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(ING. FAMULARO ROSARIO)

PROF. ING. ALBI-MARINI ARMANDO

VIALE RAFFAELLO 50

80125 NAPOLI (NA)

Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$

E-Mail: \$EMPTY_CSP_11\$

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	4	4	16/12/2019	19/12/2019
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5	10	24/12/2019	02/01/2020
Realizzazione della viabilità di cantiere	3	5	20/12/2019	24/12/2019
Apprestamenti del cantiere				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	5	8	03/01/2020	10/01/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	10/01/2020	10/01/2020
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	10/01/2020	10/01/2020
Impianti di servizio del cantiere				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	13/01/2020	13/01/2020
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	13/01/2020	13/01/2020
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	2	2	13/01/2020	14/01/2020
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2	2	14/01/2020	15/01/2020
Scavo di sbancamento	6	8	15/01/2020	22/01/2020
Viadotti				
Assemblaggio della carpenteria del pulvino e suo posizionamento	10	14	21/01/2020	03/02/2020
Assemblaggio della carpenteria rampante e suo posizionamento	18	24	20/01/2020	12/02/2020
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di viadotti	14	20	13/02/2020	03/03/2020
Getto in calcestruzzo per le strutture di viadotti	16	22	09/03/2020	30/03/2020
Montaggio e tesatura di travi prefabbricate di viadotti	15	22	30/03/2020	20/04/2020
Realizzazione di impalcato stradale	11	16	20/04/2020	05/05/2020
Formazione di manto di usura e collegamento	6	8	11/05/2020	18/05/2020
Opere d'arte				
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	16	23	15/04/2020	07/05/2020
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	10	14	27/02/2020	11/03/2020
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	5	7	25/03/2020	31/03/2020
	2	2	27/04/2020	28/04/2020
	2	2	11/05/2020	12/05/2020
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5	7	05/05/2020	11/05/2020
Opere complementari				
Posa di segnaletica verticale	1	1	19/05/2020	19/05/2020
Pulizia di sede stradale	1	1	19/05/2020	19/05/2020
Smobilizzo del cantiere	17	24	20/05/2020	12/06/2020

LEGENDA:

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

